



PNRR e cantieri: aggiornamento

31 maggio 2023



CANTIERI PNRR



16 milioni di euro
per case della comunità, ospedali di
comunità e COT




CANTIERI PNRR




Case della Comunità:

- Belluno 5,5 mln
- Agordo 2,5 mln
- Pieve 1,75 mln
- Feltre 4 mln



Ospedali di Comunità:

- Agordo 50mila
- Auronzo 450mila
- Feltre 1,5 mln



COT:


- Belluno 331mila
- Feltre 20mila



CANTIERI PNRR

Principali scadenze:

- **PROGETTO DEFINITIVO: 15/10/2022**
- **ASSEGNAZIONE CIG: 31/03/2023**
- **STIPULA CONTRATTO LAVORI: 30/09/2023**



tutti i progetti anticipano le scadenze



Casa comunità BELLUNO con Centro prelievi area San Gervasio importo di progetto 5,5 mln



Vista 1



Vista 2



Vista 3



Vista 4

- *Progetto definitivo: 04/10/22*
- *CIG: 20/03/23*
- *stipula contratto: 03/05/23*

- ***lavori consegnati: 29/05/2023***
- ***ultimazione prevista: 28/12/2024***



CANTIERI PNRR

Casa comunità Pieve (ex poliambulatorio)

importo di progetto 1,75 mln




- *Progetto definitivo: 01/09/2022*
- *CIG: 28/11/2022*
- *stipula contratto: 27/04/23*

- *prima gara deserta, adesione ad Accordo Quadro Az. Zero*
- *Consegna lavori prevista al 08/06/2023*



CANTIERI PNRR

Casa comunità Feltre (ex casa di cura Bellati) *importo di progetto 4 mln*

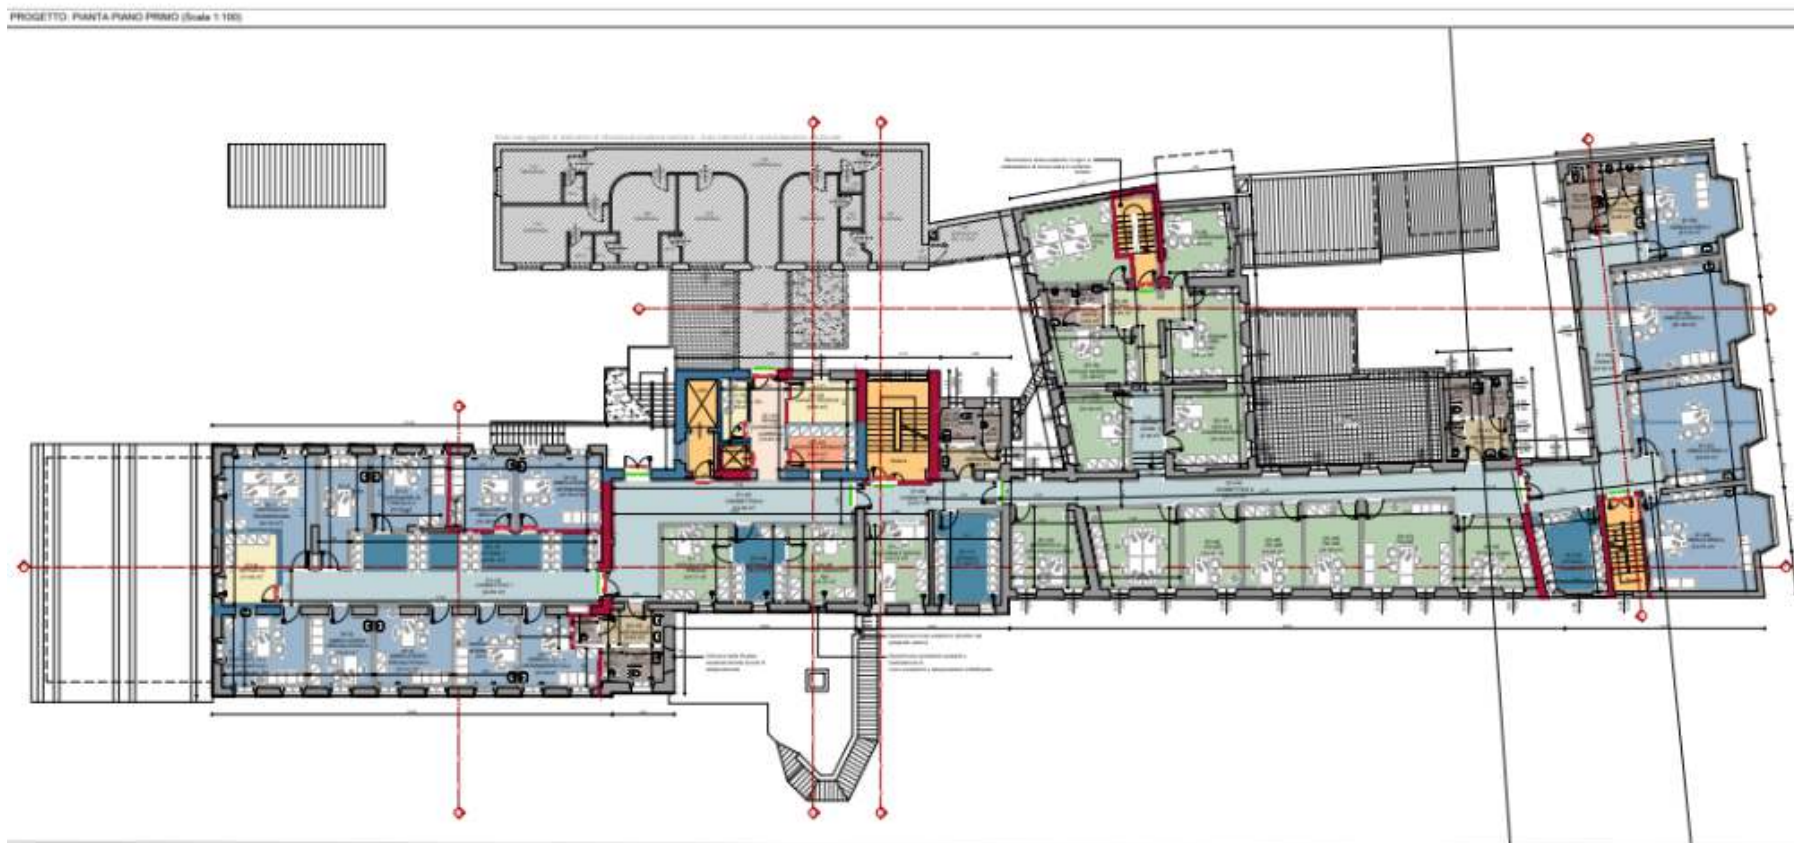

- *Progetto definitivo: 02/08/22*
- *CIG: 02/11/2022*
- *stipula contratto: 19/12/22*

- ***lavori consegnati il 13/03/2023***
- ***ultimazione prevista: 20/10/2024***



CANTIERI PNRR

Casa comunità Agordo (ospedale)

importo di progetto 2,5 mln



- *Progetto definitivo: 02/08/22*
- *CIG: 02/11/2022*
- *stipula contratto: 09/01/23*

- ***lavori consegnati: 27/03/2023***
- ***ultimazione prevista: 30/11/2024***




CANTIERI PNRR

Ospedale di Comunità Feltre -15 PL

Pad. Guarnieri

importo di progetto: 1,55 mln

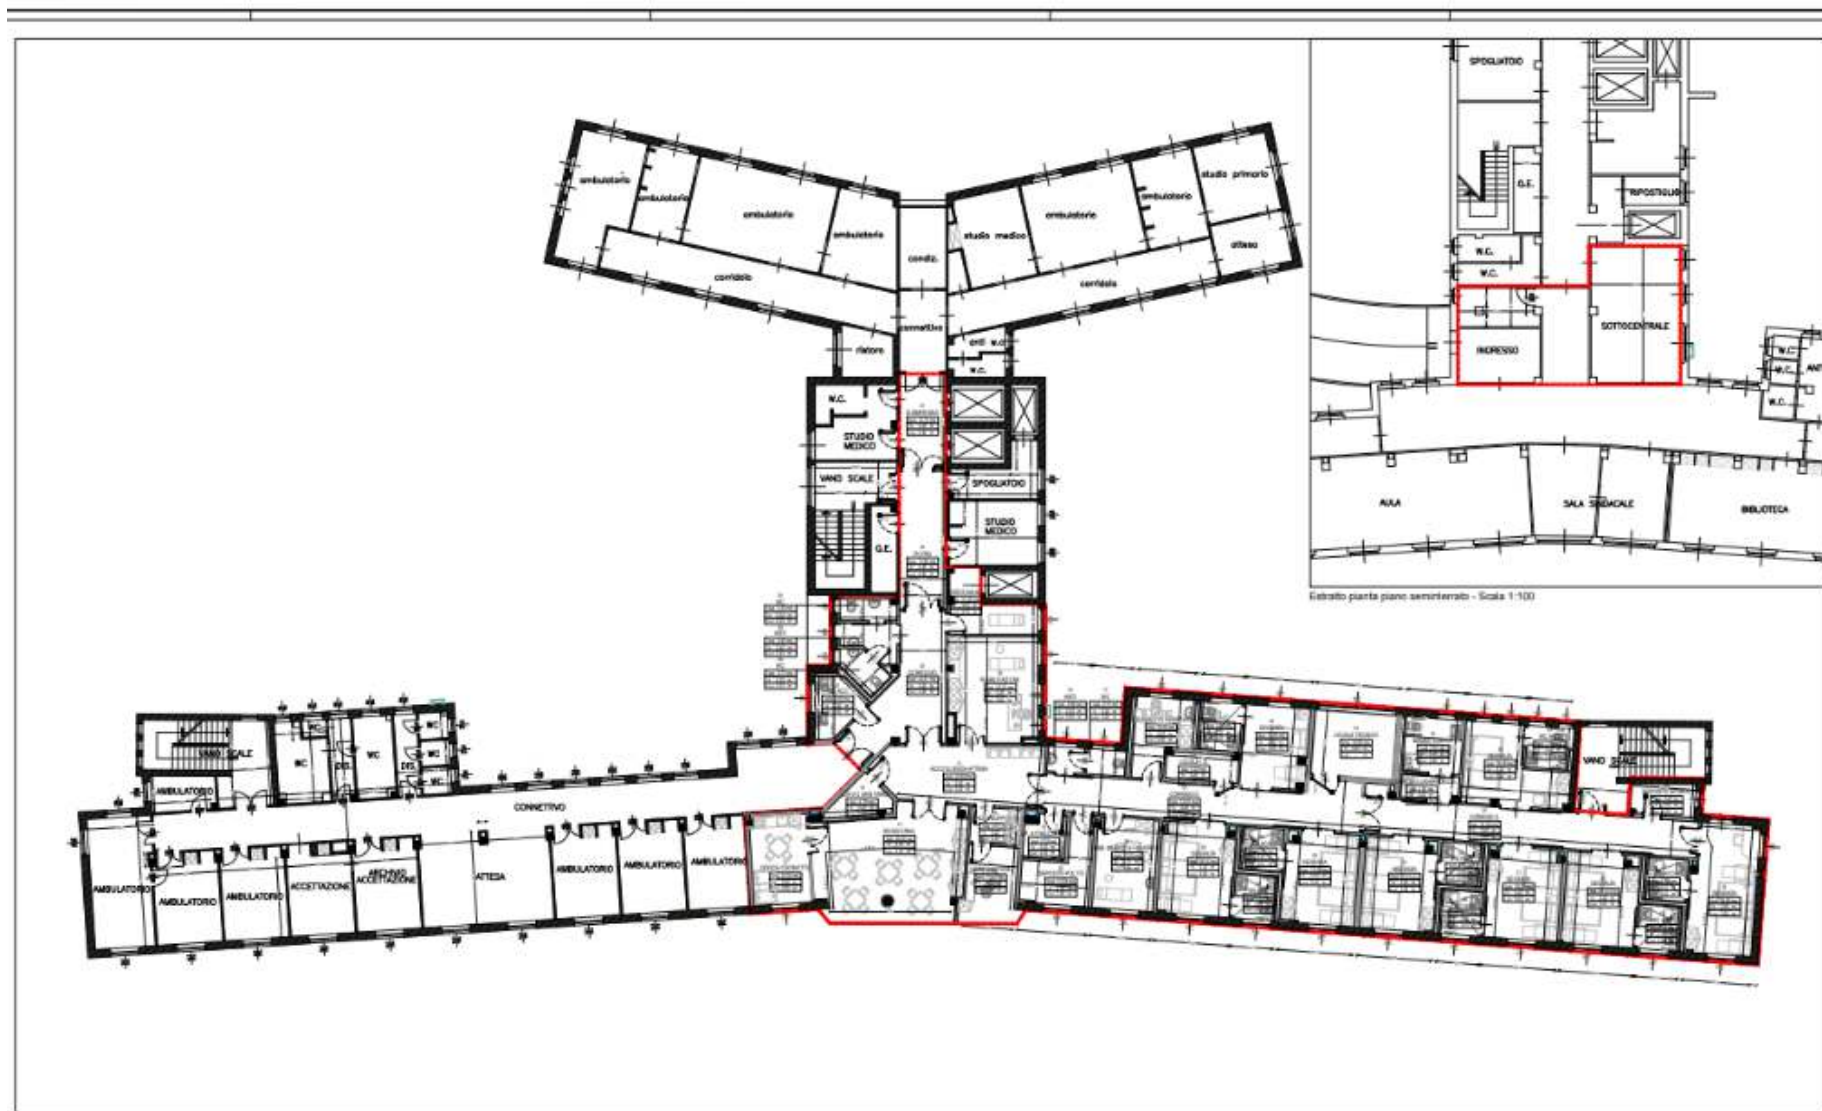

- *Progetto definitivo: 30/08/22*
- *CIG: 14/12/2022*
- *stipula contratto: 15/03/23*

- ***lavori consegnati il 20/04/2023***
- ***ultimazione prevista 13/04/2024***



CANTIERI PNRR

Ospedale di Comunità Auronzo - 21 PL

Ospedale di Auronzo

importo di progetto: 450.000 euro



- *Progetto definitivo: 04/07/2022*
- *CIG: 22/09/2022*
- *stipula contratto: 09/11/2022*

- ***lavori consegnati il 16/01/2023***
- ***ultimazione prevista 31/12/2023***



CANTIERI PNRR

Ospedale di Comunità Agordo - 17 PL

Ospedale di Agordo

importo di progetto: 50.000 euro



- *sostituzione infissi*
- *lavori terminati, in corso*
approvazione risultanze finali



Cot Belluno

331.000 euro

- *Progetto definitivo: 08/08/2022*
- *CIG: 31/10/2022*
- *stipula contratto: 12/12/2022*

- ***lavori consegnati il 23/01/2023***
- ***ultimazione prevista al 11/06/2023***

Cot Feltre

20.000 euro

- solo fornitura e posa (controsoffitti con staffaggi antisismici e installazione apparecchiature di natura impiantistica)
- in corso approvazione risultanze finali



**Oltre ai cantieri:
Le grandi apparecchiature
finanziate col PNRR**



	FONDI AZIENDALI	PNRR
	Importo progetto per lavori	Costo apparecchiatura
Risonanza Magnetica <u>BL</u>	850.000,00 €	921.472,00 €
Gamma camera con TAC Belluno	180.000,00 €	675.000,00 €
Radiologia <u>BL</u> (2 DR + 1 telecomandato)	650.000,00 €	808.900,00 €
Radiologia Pieve (1 telecomandato)	195.000,00 €	247.700,00 €
	1.875.000,00 €	2.653.072,00 €




Principali cantieri in corso



PRINCIPALI CANTIERI

SALA IBRIDA BELLUNO

3,25 milioni di euro
lavori in corso

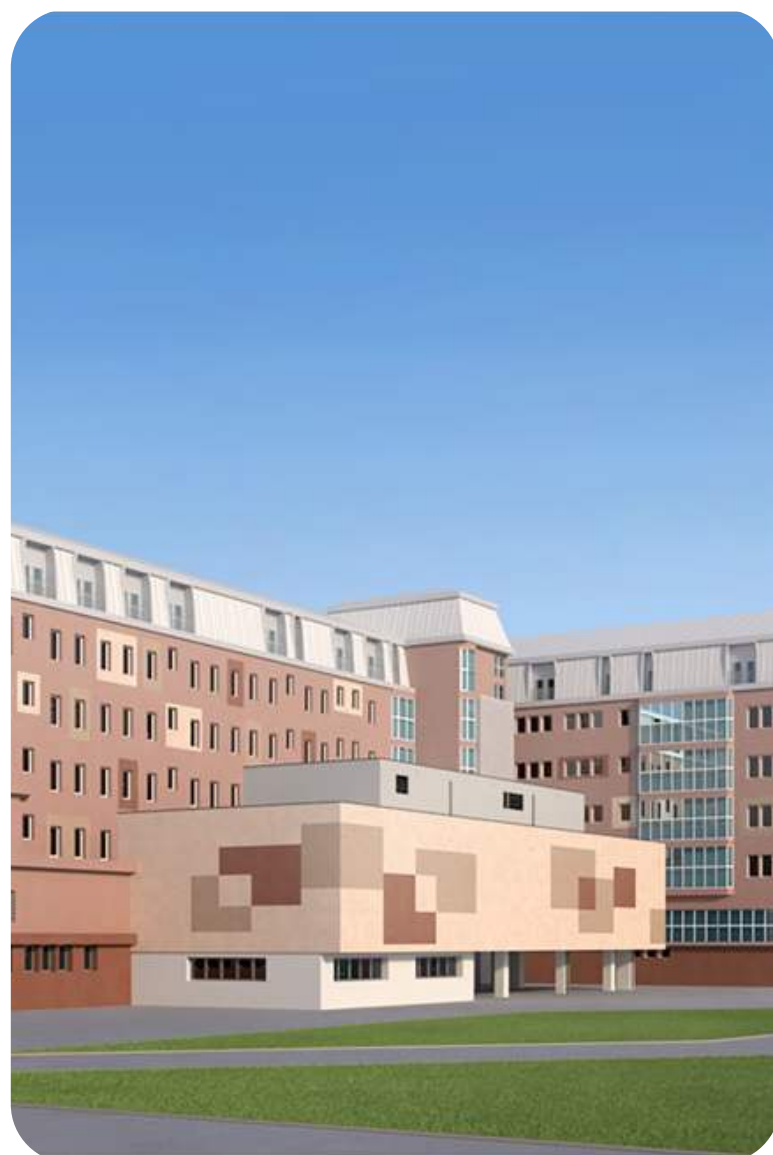

ANTISISMICA BELLUNO

45 milioni di euro
lavori in corso
ultimazione prevista:
dicembre 2026



RISTRUTTURAZIONE LAMON

5 milioni di euro
ultimazione prevista:
settembre 2023
cofinanziamento FCC
+1,9 mln
riqualificazione
parcheggio





PRONTO SOCCORSO AGORDO

3 mln

**in fase di finitura fase 3
camera calda**



RIQUALIFICA CABINE TRASFORMAZIONE BL

6,4 mln

lavori in corso





CANTIERI IN CORSO

ANTINCENDIO AGORDO

Collaudo in corso

770 mila

ANTISISMICA FELTRE

in corso progettazione
fattibilità tecnica

32 milioni di euro

ANTINCENDIO AURONZO

in corso

630 mila

PIASTRA ENDOSCOPICA FELTRE

in corso di redazione
progetto di fattibilità

2 milioni di euro

ANTINCENDIO PIEVE

in corso

950 mila
